





Projektets udfordringer og usikkerheder




Projektets udfordringer

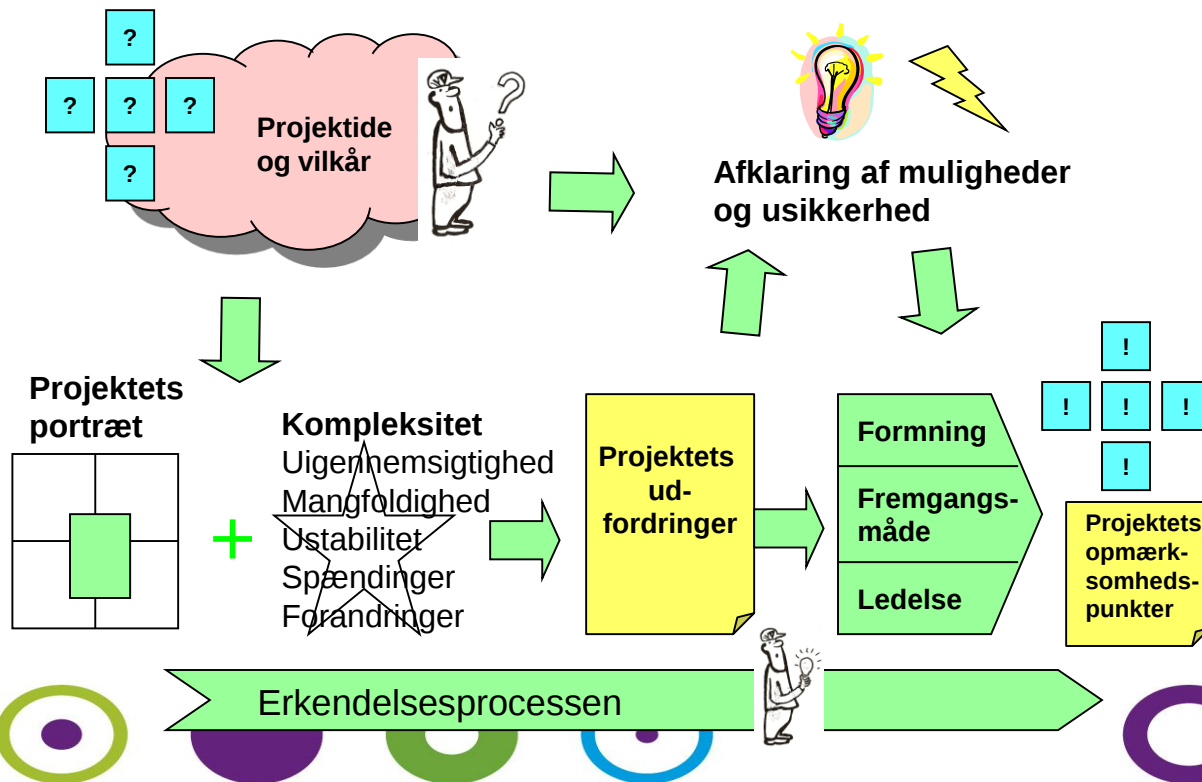


Projektets portræt

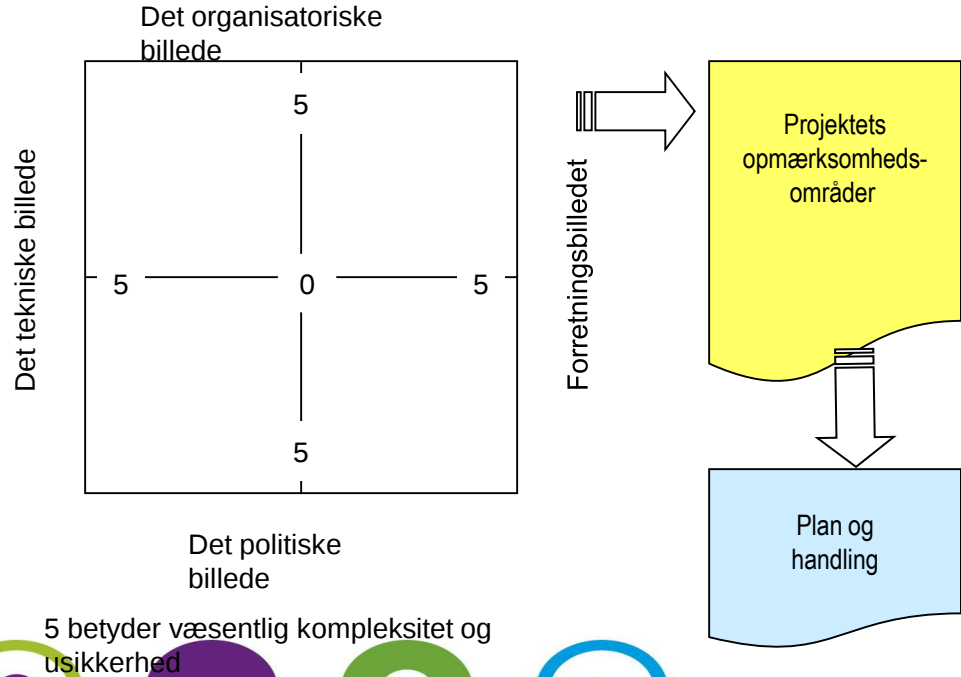

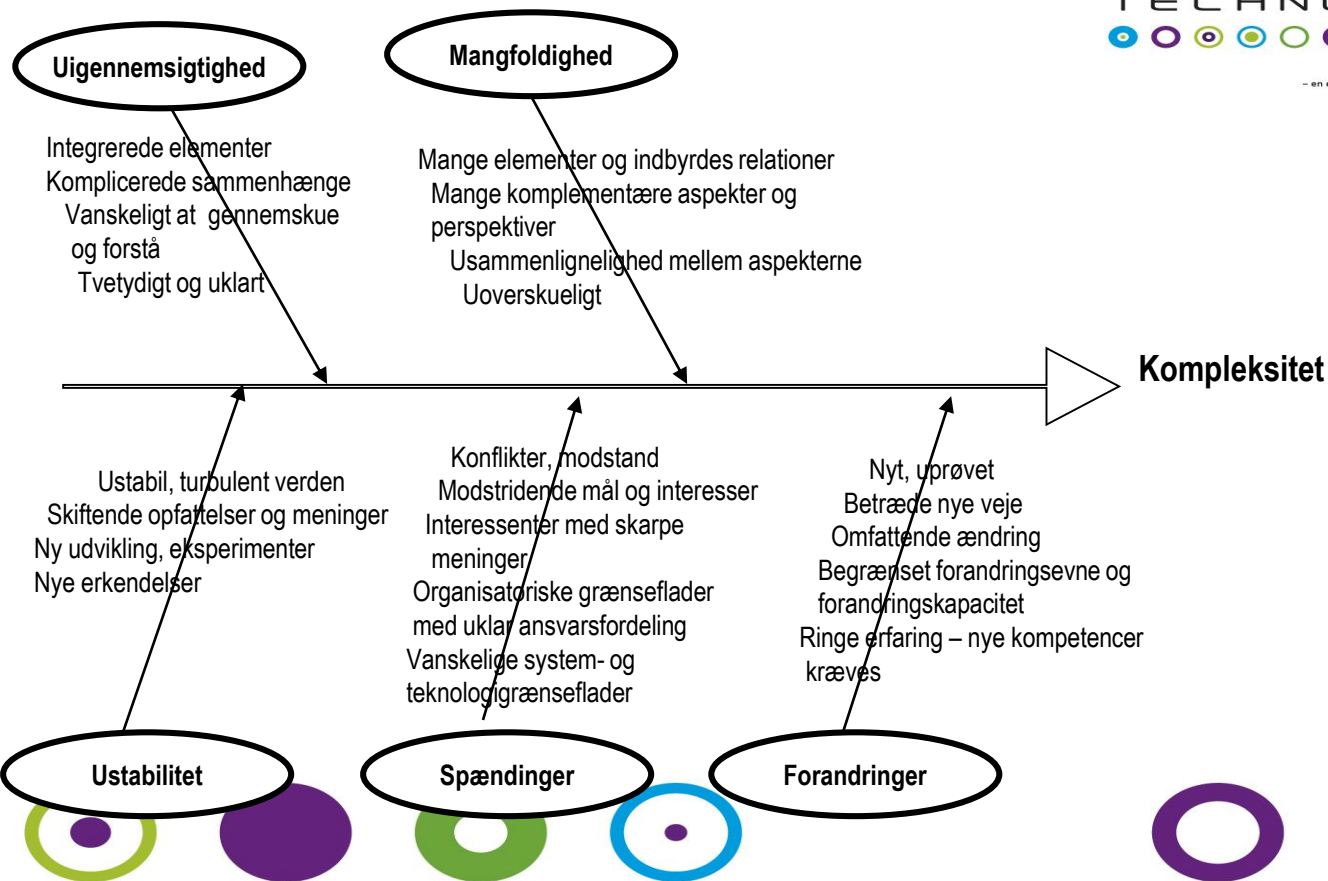

Usikkerhed ved milepæle er knyttet til:

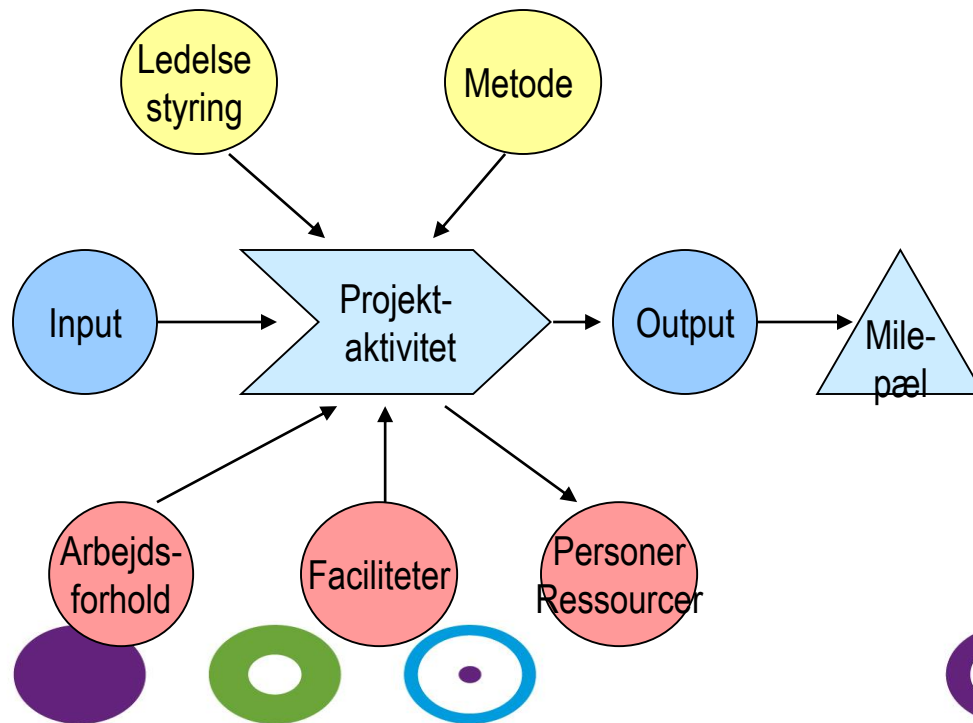

Ordning af risici

Sand- synlig- hed	Stor	Forebyg for at reducere sandsynlighed	Forebyg for at reducere sandsynlighed Plan B	Forebyg for at reducere både sandsynlighed og virkning
	Nogen	Negligér	Forebyg for at afbøde virkning	Forebyg for at afbøde virkning Plan B
	Lille	Negligér	Negligér	Plan B
		Ringe	Alvorlig	Katastrofal
		Virkning		

Sandsynlighed = for at det sker trods sædvanlig ledelse og kvalitetssikring

Virkning = på projektets tidsterminer og omkostninger
= på produktets funktion, kvalitet, økonomi
= på drifts- og forretningsudbytte


1. Placer risikoen i matricen
2. Vælg strategi
3. Planlæg modforanstaltninger hvis nødvendigt
4. Planlæg overvågning og risk-stone

Strategier for håndtering af usikkerhed

- Faser og beslutningspunkter
- Tids- og budgetreserver
- Projektevalueringer og review undervejs
- Afprøvninger undervejs
- Procedurer for styring af ændringer
- Alternative løsninger og metoder/planer
- Styring af konfiguration
- Målstyring



Risikostyringsplan

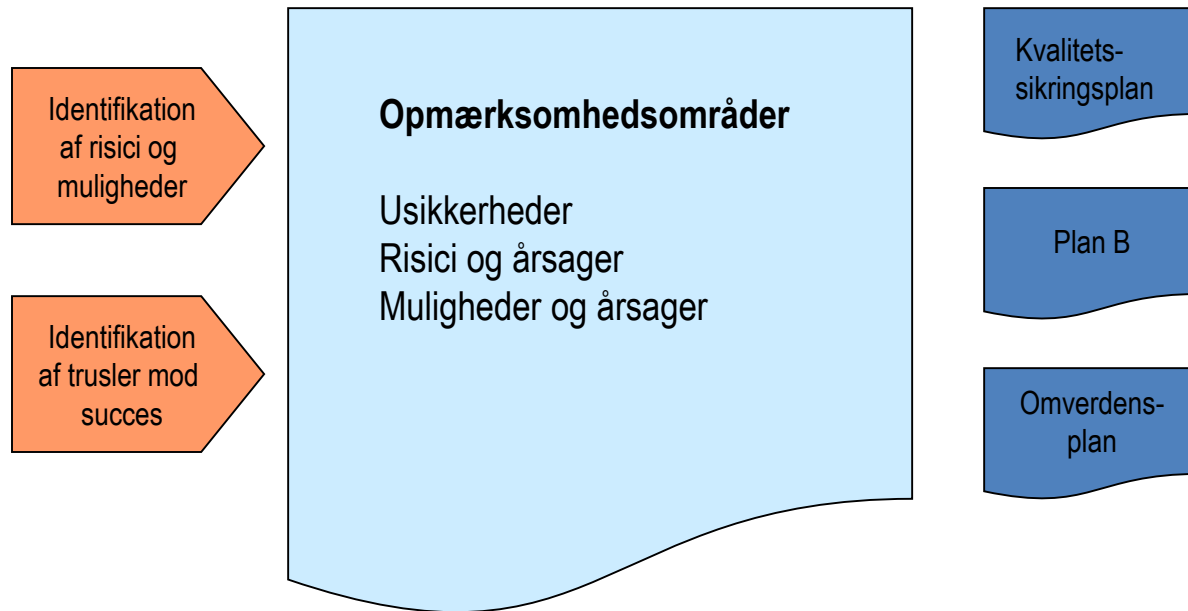

Se arbejdsskema

Afdækning af udfordringer og risici
ved indførsel af det nye postsystem.

Fremlægning 😊

